

高砂市耐震改修促進計画(改訂版)の中間検証について

1 目的

高砂市耐震改修促進計画(改訂版)の計画期間は、平成28年度から令和7年度までの10年としており、5年目に当たる令和2年度に進捗状況の検証を行った。

2 進捗状況の検証


(1) 目標に対する進捗検証

① 住宅の耐震化の目標 (評価 △)

住宅の耐震化率

84.8% (▲1.9)

目標: 令和7年 95%

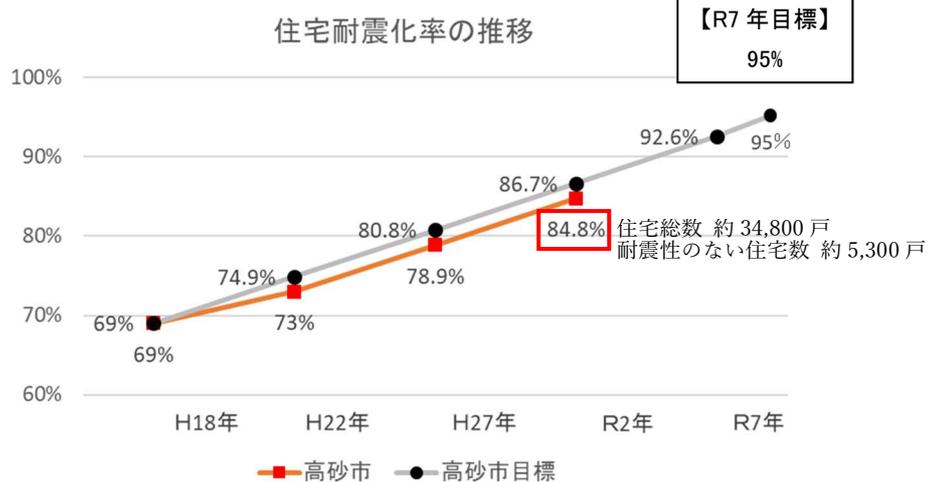


② 多数利用建築物の耐震化の目標 (評価 ○)

多数利用建築物の耐震化率

91.4% (+5.4)

目標: 令和7年 95%

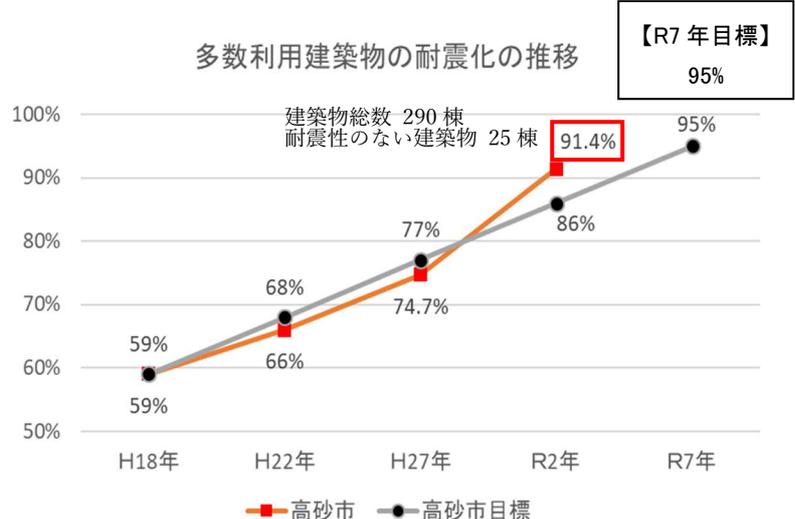

(2) 施策に対する進捗状況

高砂市耐震改修促進計画に住宅の耐震化に対する新たな施策として下記の項目を掲げ、実施済である。

- ① ひょうご住まいの耐震化促進事業(県事業分)の市事業化 (評価 ○)
- ② 重点エリア設定し、出前講座や戸別訪問を実施 (評価 ○)
- ③ バリアフリーリフォーム補助と連携できる仕組みの構築 (評価 ○)

3 計画の中間検証の結果について

計画に掲げる目標及び施策に対し、概ね計画どおりに進捗できている。今後も本計画に従い、前期で整備した補助制度を活用しながら、啓発活動を中心に目標達成に向け耐震化を促進していくものとする。
